

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	株式会社 雄組様
工事名 ※2	(株)雄組試験施工
施工年月日	27年 12月26日～27年12月26日
施工場所 ※3	福岡県筑紫野市岡田3丁目地内
施工規模	2.00m ²
担当者	御社名(株)雄組 担当者名 泉 卓也 認定番号 CKN1001-1517
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草 地下貯留・ その他() いずれかに○
配合	土 0.1m ³ 当り 固化材 : 1.0kg 団粒化剤 : 0.2ℓ 水 : 3.8ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事写真帳

工事番号 平成27年度

工事名 (株)雄組試験施工

工事箇所 福岡県筑紫野市岡田3丁目地内

工 期 着 手 平 成 2 7 年 1 2 月 2 6 日

竣 工 平 成 2 7 年 1 2 月 2 6 日

工事施工者 株式会社 雄組

写真区分:着工前
写真タイトル:着工前





写真区分:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:竣工
写真タイトル:真砂土





写真区分:竣工
写真タイトル:グラウンド



写真区分:竣工
写真タイトル:防草





写真区分:施工状況



写真区分:施工状況



写真区分:施工状況



写真区分:施工状況



写真区分:施工状況



写真区分:施工状況



写真区分:施工状況



写真区分:施工状況



写真区分:施工状況

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	淡窓学園 筑紫野幼稚園様
工事名 ※2	筑紫野幼稚園グラウンド整備工事
施工年月日	28年 4月10日～28年9月1日
施工場所 ※3	福岡県筑紫野市大字筑紫地内
施工規模	1400m ²
担当者	御社名（株）雄組 担当者名 泉 卓也 認定番号 CKN1001-1517
種別	グラウンド 広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（ ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：10kg 団粒化剤：2ℓ 水：60ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ① 前の日に雨が降り真砂土が水を含んでたため、水を正規の60ℓ→20ℓに変更した。 ② グラウンドの中央部分にグリーン色で施工した後、雨が降り真砂土が表面に追い被さりグリーン色が隠れた為、グリーン色の外周にスポンジの枠を入れた。 ③ グラウンドに石ころが入ってた為、人力振るいをしたら団粒化したのを潰した事に気付かずそのまま施工した結果透水しなかった為、再度改良したら透水した。（パウダー状態になっていた） ④ グラウンド中央部分にグリーン色にしたのですが、表面の色が徐々に抜け落ちてる状態です。ほじくり返すと当初のグリーン色がくつきり出ている。 ⑤ 勾配はあまり付けてないのですがトス土の表面が流された為、外周にスポンジの枠を入れ、流された場所は、タフロックを投入し固めた。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事写真帳

工事番号 平成28年度

工事名 筑紫野幼稚園グランド整備工事

工事箇所 福岡県筑紫野市大字筑紫地内

工 期 着 手 平成28年 4月10日

竣 工 平成28年 9月 1日

工事施工者 株式会社 雄組



写真区分: 筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種: 着工前
写真タイトル: 着工前



写真区分: 筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種: 着工前
写真タイトル: 着工前



写真区分: 筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種: 着工前
写真タイトル: 着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分: 筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種: 施工状況



写真区分: 筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種: 施工状況



写真区分: 筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種: 施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:筑紫野幼稚園グラ
ウンド整備工事
工種:施工状況



施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	大野城市役所様
工事名 ※2	道路維持工事
施工年月日	28年 5月24日～28年6月20日
施工場所 ※3	福岡県大野城市大城5丁目地内
施工規模	1.0m ²
担当者	御社名（株）雄組 担当者名 泉 卓也 認定番号 CKN1001-1517
種別	グラウンド・広場・園路・外構・ 防草 地下貯留・ その他（ ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：60kg 団粒化剤：2ℓ 水：40ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ① モルタルミキサーで攪拌すると3cm位の団子ができ、敷均時に団子を潰しながらの施工で時間がかかった。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事写真帳

工事番号 平成28年度



工事名 道路維持工事

工事箇所 福岡県大野城市大城5丁目付近

工 期 着 手 平 成 2 8 年 5 月 2 4 日



竣 工 平 成 2 8 年 6 月 2 0 日

工事施工者 株式会社 雄組



写真区分:大野城市役所維持
・防草対策工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:大野城市役所維持
・防草対策工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前





写真区分: 大野城市役所維持
・防草対策工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工



写真区分: 大野城市役所維持
・防草対策工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工



写真区分: 大野城市役所維持
・防草対策工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工



写真区分: 大野城市役所維持
・防草対策工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工



写真区分: 大野城市役所維持
・防草対策工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工



写真区分: 大野城市役所維持
・防草対策工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	淡窓学園 筑紫野中央幼稚園様
工事名 ※2	筑紫野中央幼稚園グラウンド整備工事
施工年月日	28年 4月26日～28年8月31日
施工場所 ※3	福岡県筑紫野市上古賀3丁目地内
施工規模	1,200m ²
担当者	御社名 (株) 雄組 担当者名 泉 卓也 認定番号 CKN1001-1517
種別	グラウンド 広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他 () いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材 : 10kg 団粒化剤 : 2ℓ 水 : 60ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ① 前の日に雨が降り真砂土が水を含んでたため、水を正規の 60ℓ→20ℓに変更した。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事写真帳

工事番号 平成28年度

工事名 筑紫野中央幼稚園グラウンド整備工事

工事箇所 福岡県筑紫野市上古賀3丁目地内

工 期 着 手 平 成 2 8 年 4 月 2 6 日

竣 工 平 成 2 8 年 8 月 3 1 日

工事施工者 株式会社 雄組



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前

⊕

⊕



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:筑紫野中央幼稚園
グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	キンダーガルテンどんぐり園様
工事名 ※2	キンダーガルテンどんぐり園グラウンド整備工事
施工年月日	28年 8月24日～28年10月21日
施工場所 ※3	福岡県北九州市八幡西区藤原2丁目地内
施工規模	52.2m ²
担当者	御社名（株）雄組 担当者名 泉 卓也 認定番号 CKN1001-1517
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草 地下貯留・ その他（ ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：10kg 団粒化剤：2ℓ 水：40ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ① 0.1BH 揹拌なので 1m ³ に対して 20 分～30 分攪拌した。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事写真帳

工事番号 平成28年度

工事名 キンダーガルテンどんぐり園グラウンド整備工事

工事箇所 福岡県北九州市八幡西区藤原2丁目地内


工 期 着 手 平 成 2 8 年 8 月 2 4 日

竣 工 平 成 2 8 年 1 0 月 2 1 日

工事施工者 株式会社 雄組




写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前

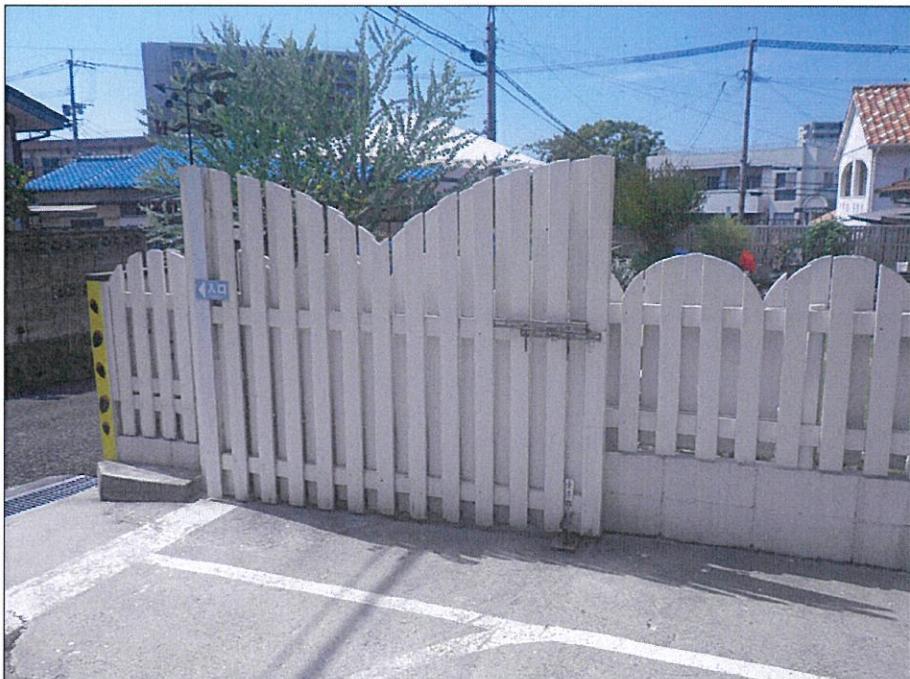

写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:着工前
写真タイトル:着工前



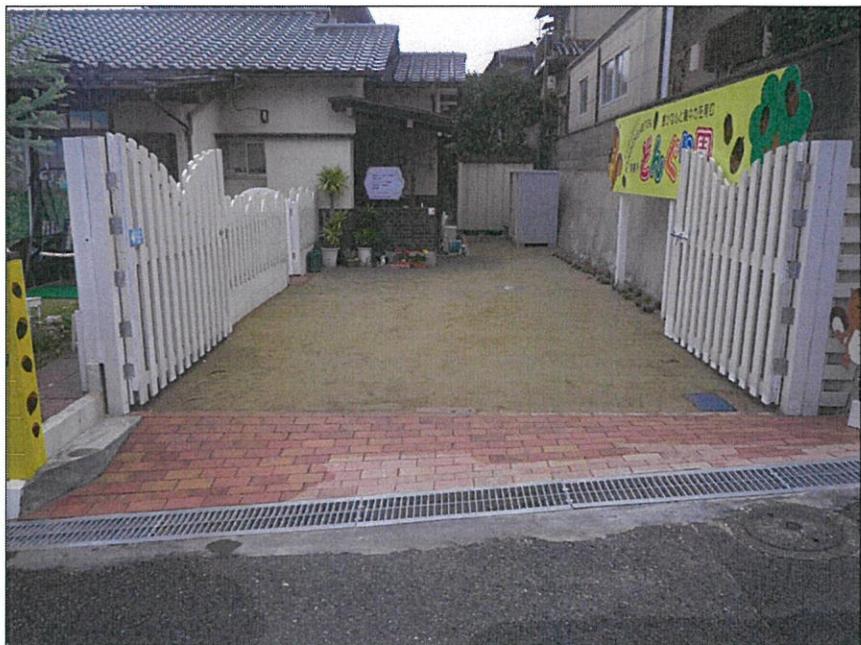

写真区分: キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工

⊕



写真区分: キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工

⊕



写真区分: キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種: 竣工
写真タイトル: 竣工



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:竣工
写真タイトル:竣工






写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況

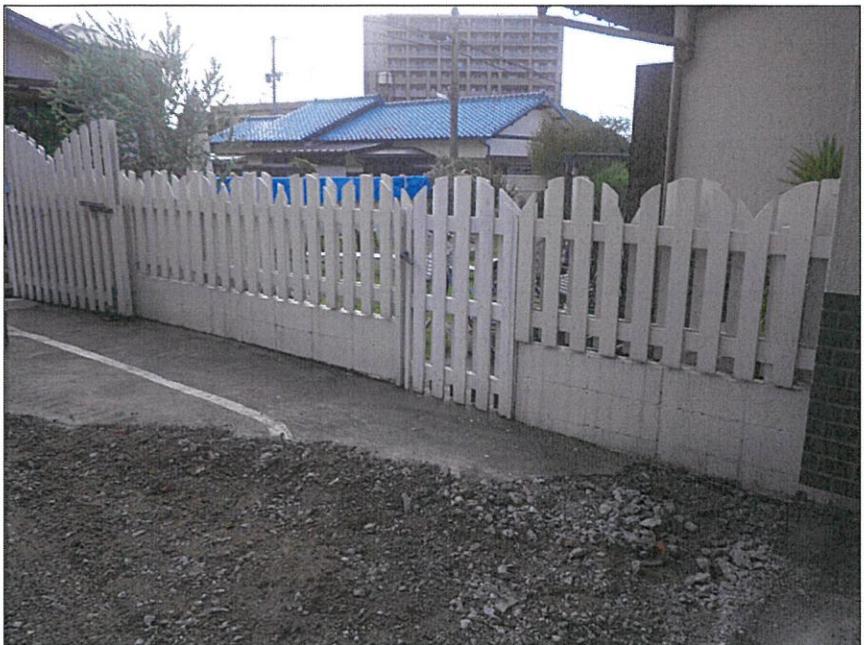

写真区分: キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種: 施工状況



写真区分: キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種: 施工状況



写真区分: キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種: 施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況




写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工
事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工
事
工種:施工状況

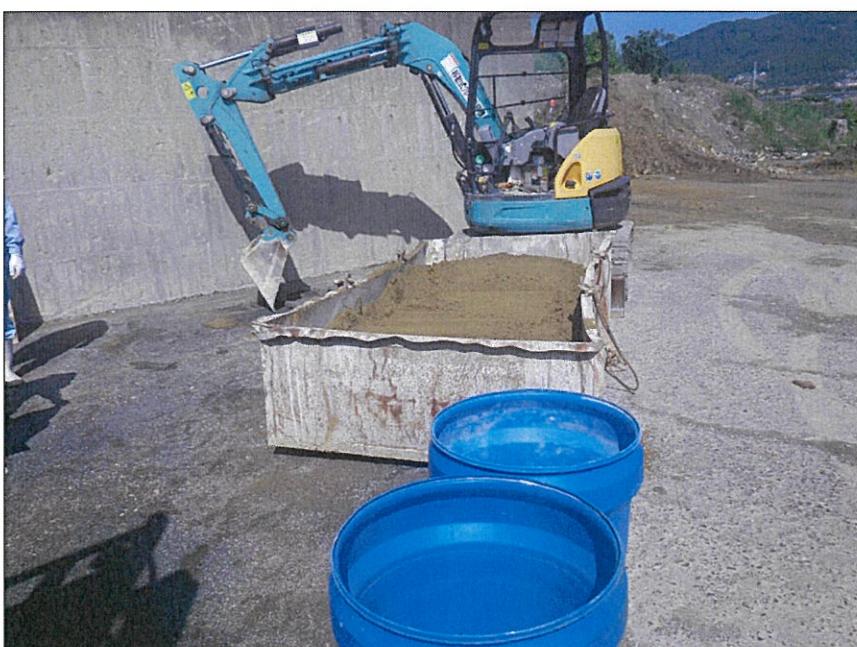

写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工
事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況




写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況

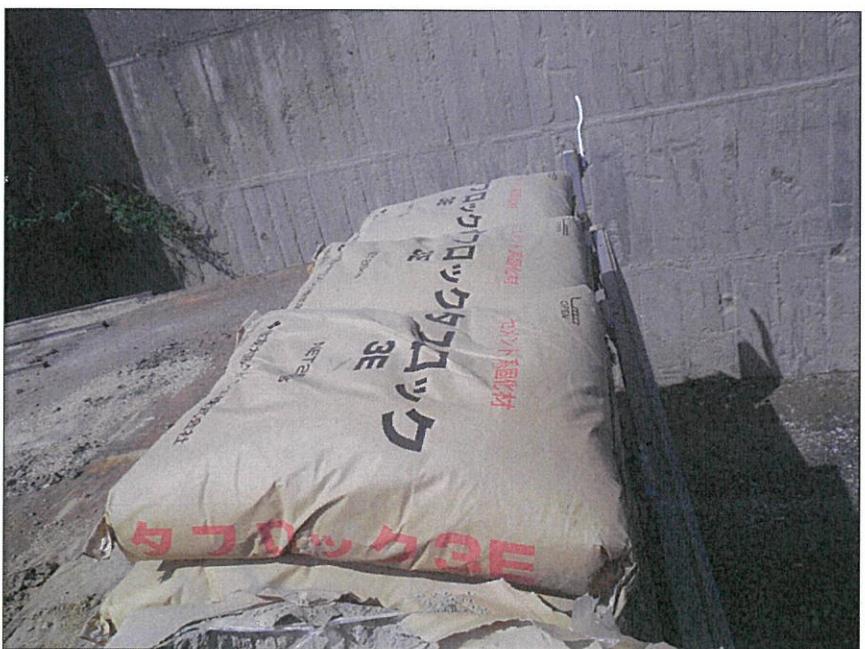

写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況




写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況

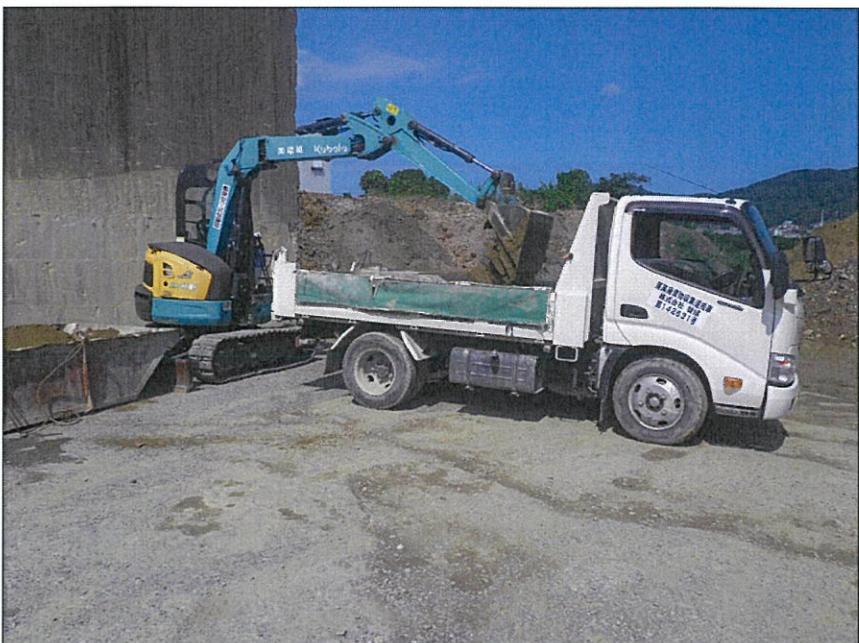

写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況




写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工
事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工
事
工種:施工状況

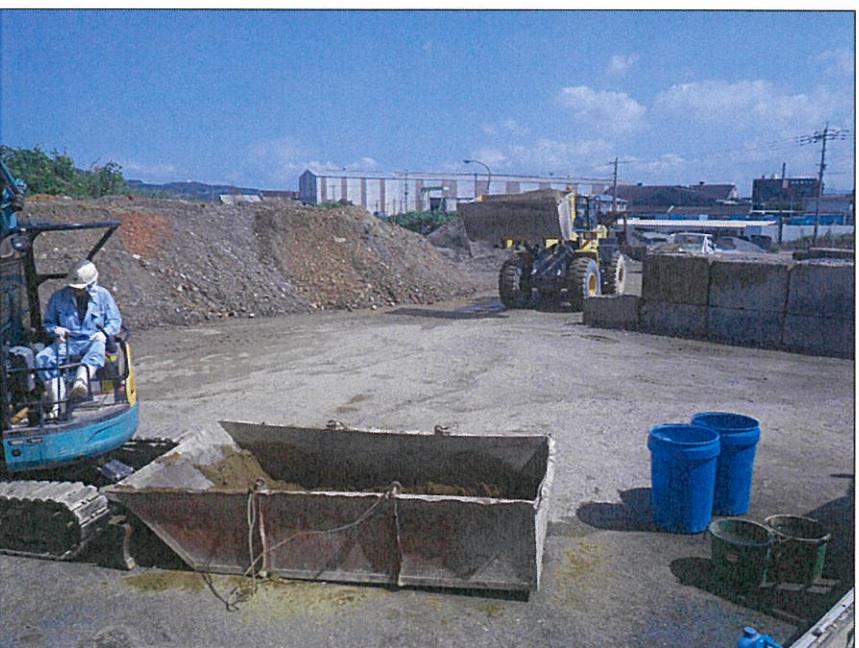

写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工
事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況




写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況

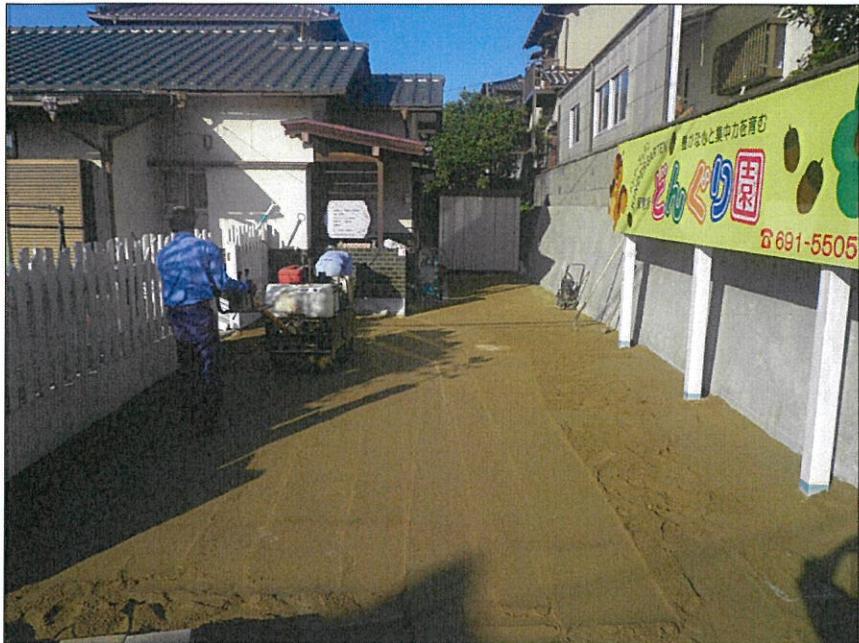

写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況



写真区分:キンダーガルテン
どんぐり園グラウンド整備工事
工種:施工状況

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	永井様
工事名 ※2	永井様邸 防草対策工事
施工年月日	28年 10月18日～28年10月21日
施工場所 ※3	福岡県糟屋郡宇美町神武原3丁目地内
施工規模	39.0m ²
担当者	御社名（株）雄組 担当者名 泉 卓也 認定番号 CKN1001-1517
種別	グラウンド・広場・園路・外構 防草 地下貯留・ その他（ ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：60kg 团粒化剤：2ℓ 水：40ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ① 施工時風が強かった為トス土表面が乾燥し始めたので、2回目攪拌の時に+20ℓ追加したら、ちょうどよく転圧が出来た。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事写真帳

工事番号 平成28年度

工事名 永井様邸防草対策工事

工事箇所 福岡県糟屋郡宇美町神武原3丁目地内

工 期 着 手 平 成 2 8 年 1 0 月 1 8 日

竣 工 平 成 2 8 年 1 0 月 2 1 日

工事施工者 株式会社 雄組

写真区分:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:着工前
写真タイトル:着工前




写真区分:着工前
写真タイトル:着工前



写真区分:竣工
写真タイトル:竣工




写真区分:竣工
写真タイトル:竣工

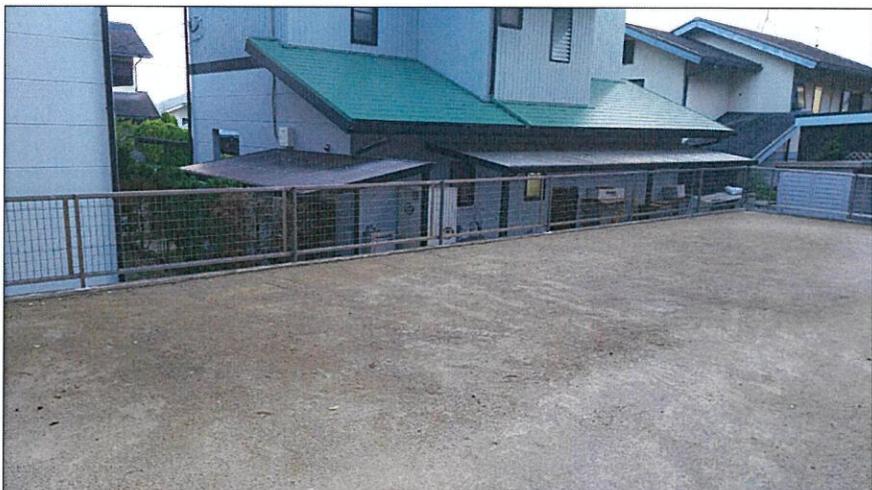

写真区分:竣工
写真タイトル:竣工



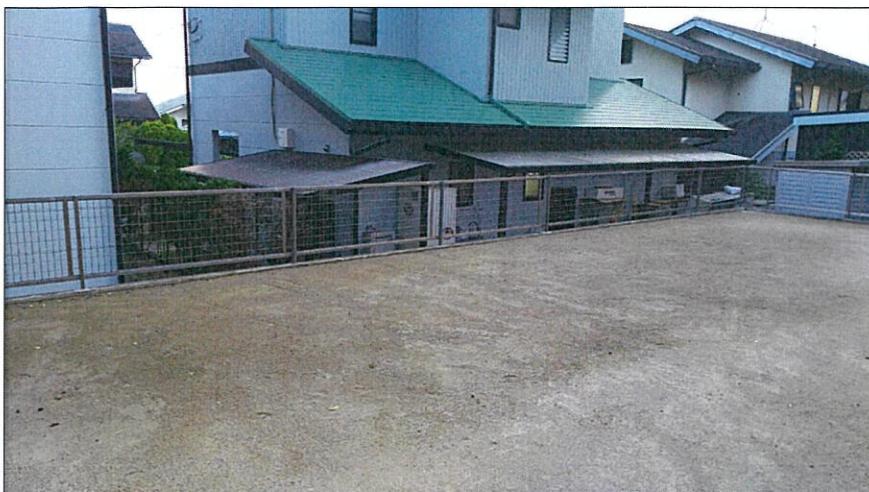

写真区分:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:竣工
写真タイトル:竣工



写真区分:竣工
写真タイトル:竣工

写真区分:竣工
写真タイトル:竣工

